

平成31年4月からの認定こども園移行にあたり、4月からは以下の図のクラス配置で園運営を実施することになりました。保護者の皆様にはご迷惑をお掛け致しますがご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

現在のクラス配置(平成30年度)

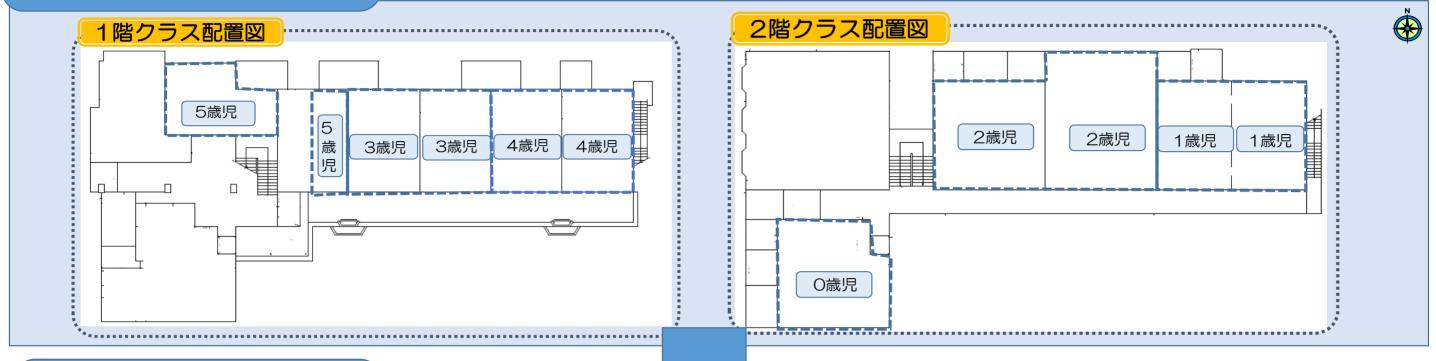


平成31年4月からのクラス配置

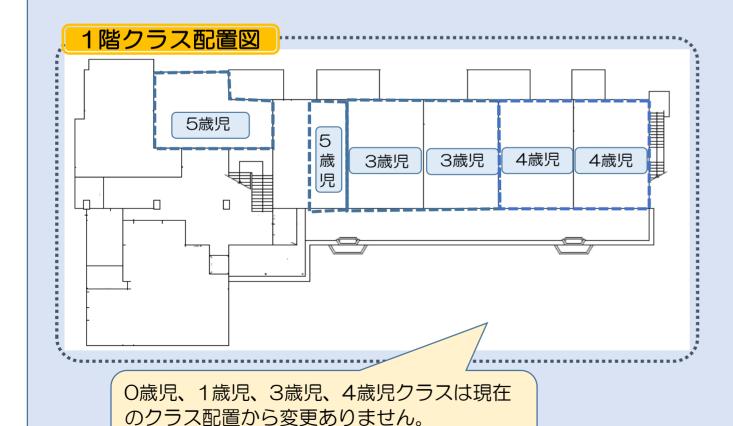

工事開始にあたり、園舎の竣工時期を平成31年5月中頃予定でお知らせしておりましたが、工事スケジュールに遅れが発生していることから、現時点において、以下図A→Bのスケジュールに変更となる見込みとなりました。

変更後のスケジュールでは、新園舎の竣工を7月末としており、 その後関係機関の検査を経て8月中頃に新園舎に引っ越ししていただ く予定をしております。また、新園舎の竣工が遅れることにより、 解体等の園庭整備が12月中旬に竣工し、その後仮園庭の整備を1月 中旬に竣工する予定です。


保護者の皆様には工事に関して日頃からご理解・ご協力いただい ているところです。スケジュールの遅れによりご迷惑をお掛け致し ますが、何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。



A 工事開始時点でのスケジュール

- 新園舎建築工事
- 既存園舎解体 新園庭整備工事
- 仮園庭等復旧丁事

平成30年10月~平成31年 5月中頃 平成31年 6月~平成31年 9月末 平成31年10月~平成31年10月末

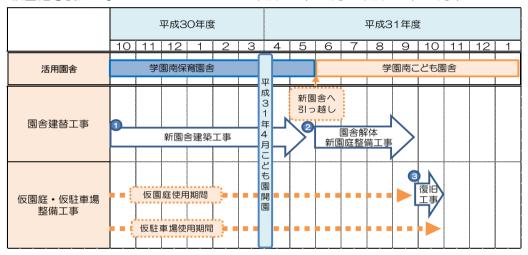

B 現時点でのスケジュール

- 新園舎建築工事
- 既存園舎解体 新園庭整備工事
- 仮園庭等復旧工事

平成30年10月 ~平成31年 7月末 平成31年 8月中旬~平成31年12月中旬 平成32年12月末 ~平成32年 1月中旬

